


Conservings- & Transportlijst			
Fase naam	Afwerking	Commentaar	Oprachtfase
CONS 32.1	2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 80µm	Constructie Atriumdak (dakconstructie)	-1008
CONS 32.2	THERMISCH VERZINKT	Constructie Atriumdak (dakconstructie)	-1008
CONS 32.6	VILTON HDP	Koudebrugonderbreking	-1008
CONS 32.7	2 COMP ZFF PRIMER RAL tijdelijk 80µm	Montage-hulpstaal	-1008
DRA 32.8	N.V.T.	Draaieind	-1008
ANK 32.9	N.V.T.	Ankers	-1008
CONS 44.1	2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 80µm	Constructie Atriumdak (dakconstructie)	-1008
CONS 44.2	THERMISCH VERZINKT	Constructie Atriumdak (dakconstructie)	-1008
ANK 44.9	N.V.T.	Ankers	-1008

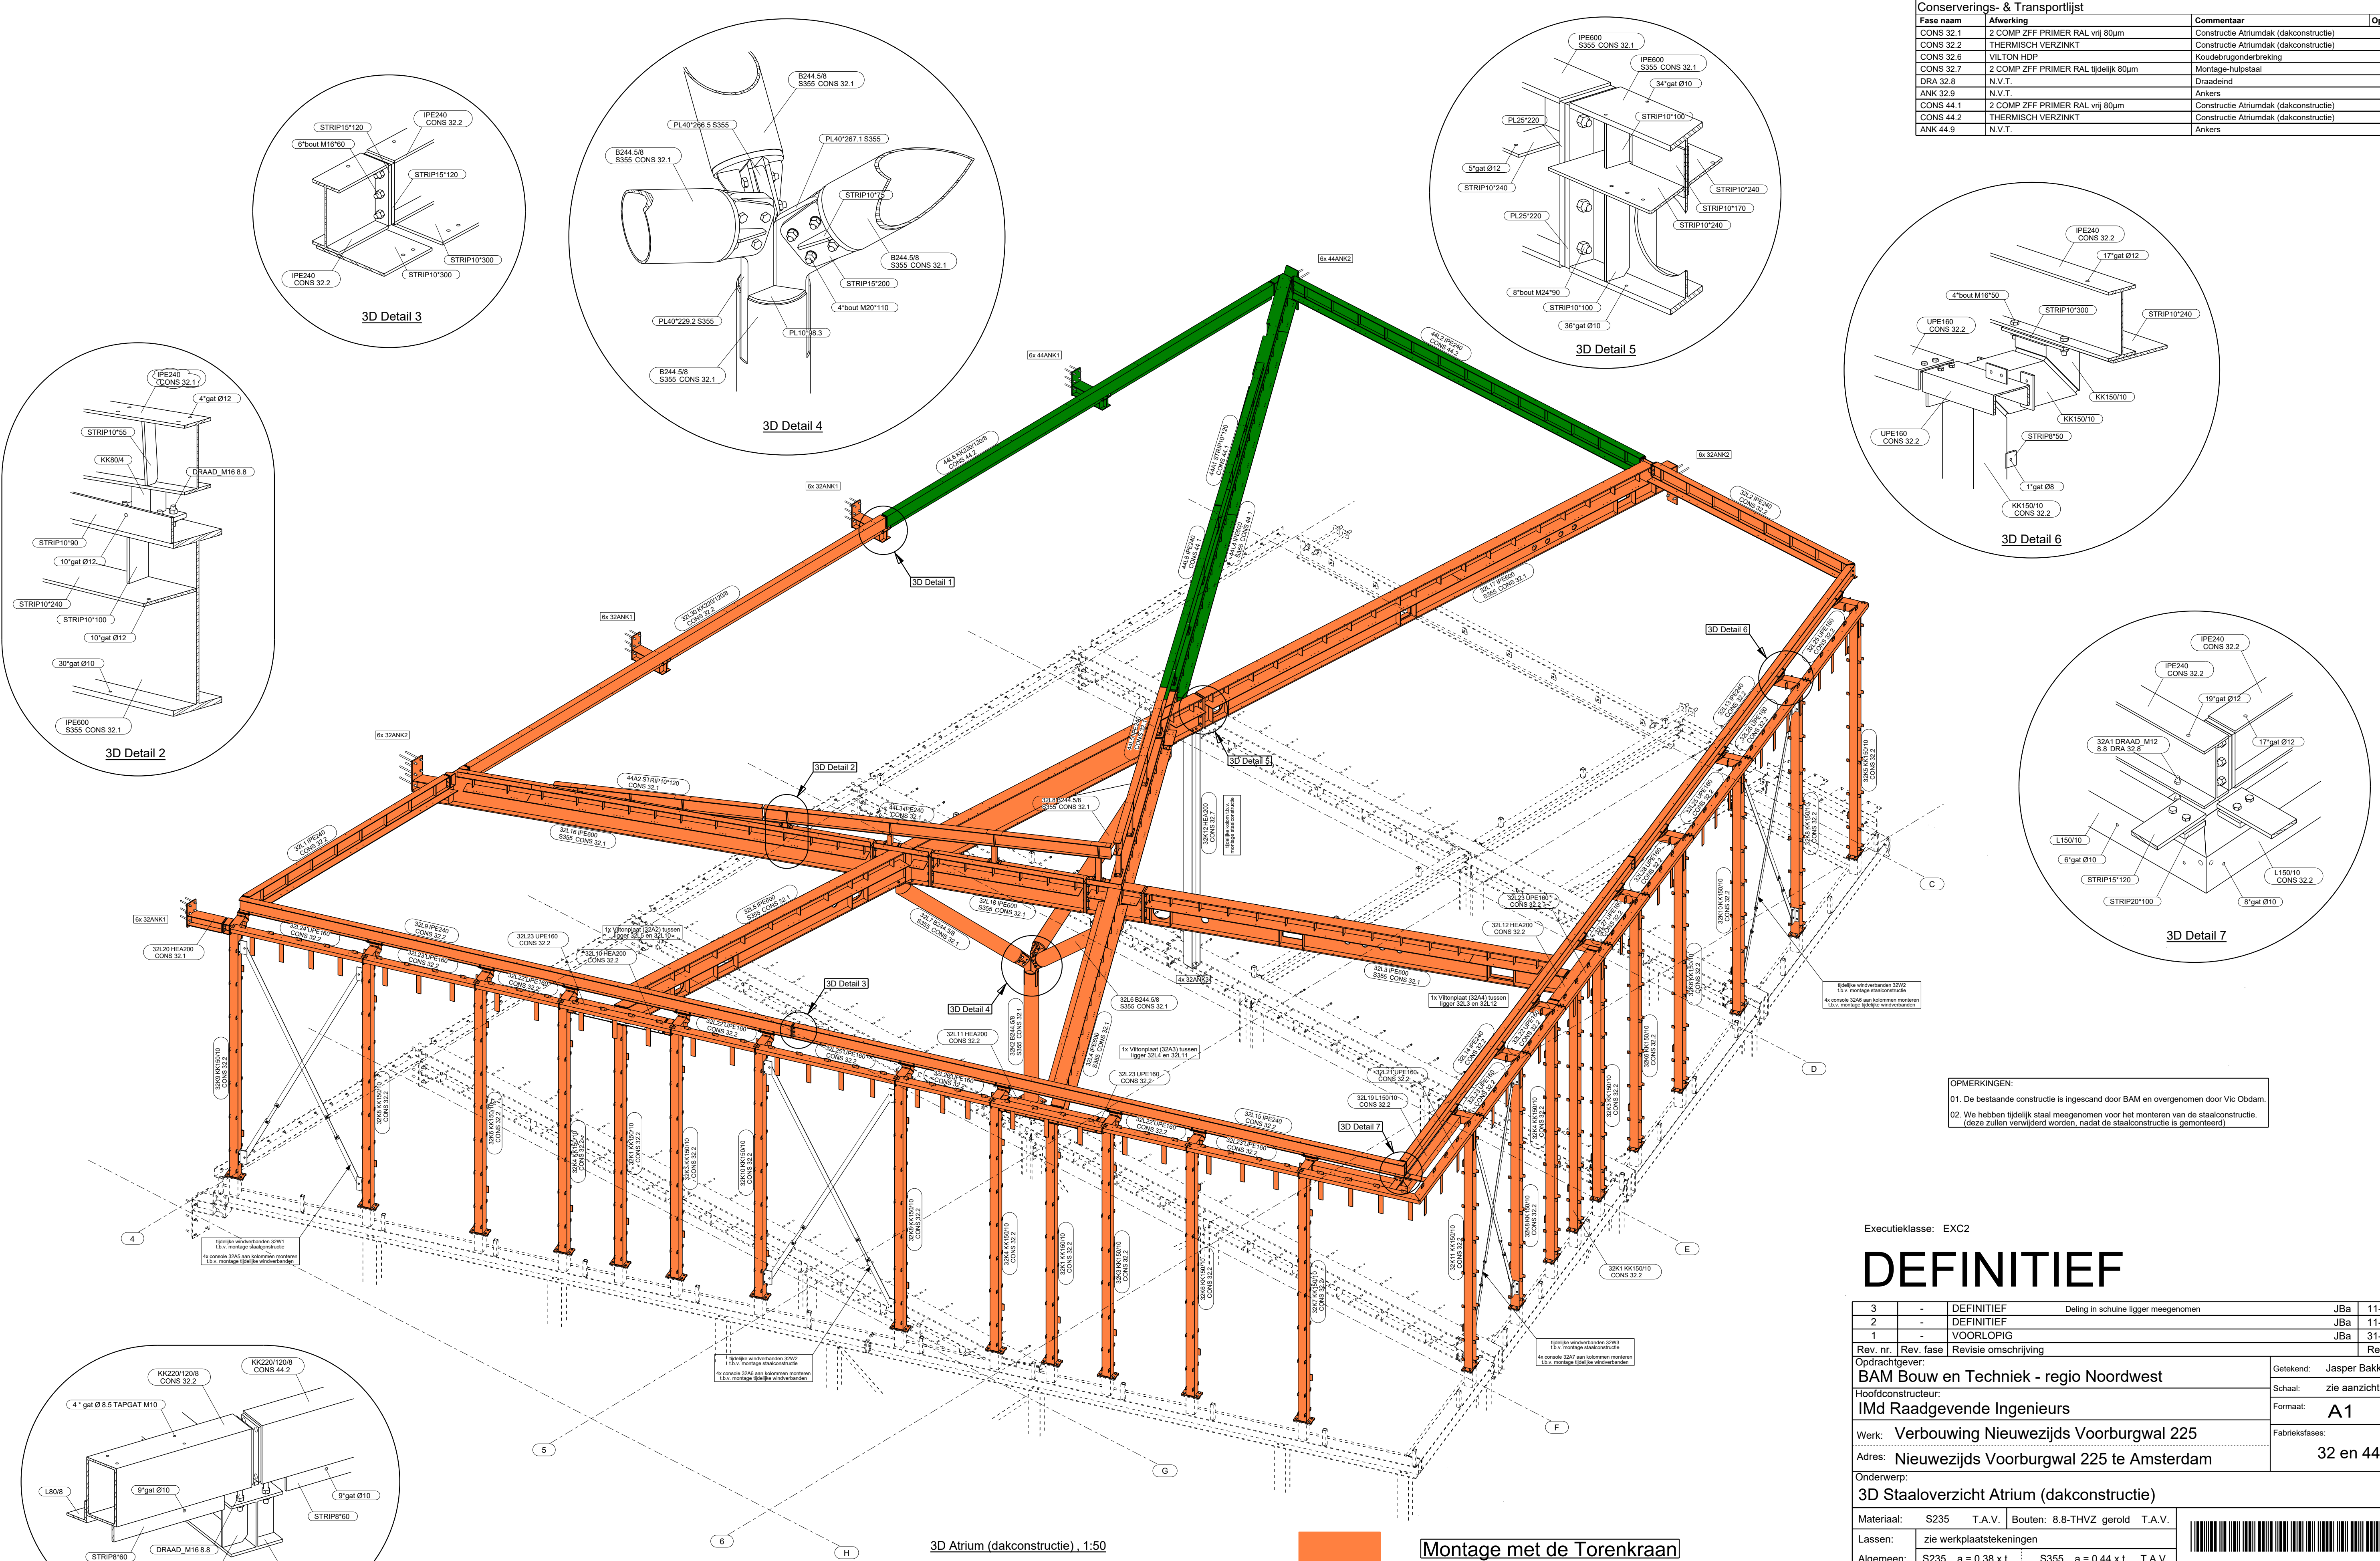

OPMERKINGEN:
01. De bestaande constructie is ingescand door BAM en overgenomen door Vic Obdam.
02. We hebben tijdelijk staal meegenomen voor het monteren van de staalconstructie.
(deze zullen verwijderd worden, nadat de staalconstructie is gemonteerd)

Executieklass: EXC2

DEFINITIEF

3	-	DEFINITIEF	Deling in schuine ligger meegenomen	JBa	11-02-2019
2	-	DEFINITIEF		JBa	11-02-2019
1	-	VOORLOPIG		JBa	31-10-2018

Rev. nr.	Rev. fase	Revisie omschrijving	Rev. datum
Opdrachtgever: BAM Bouw en Techniek - regio Noordwest			
Hoofdconstructeur: Imd Raadgevende Ingenieurs			Getekend: Jasper Bakker
Werk: Verbouwing Nieuwezijds Voorburgwal 225			Schaal: zie aanzicht
Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam			Formaat: A1
Onderwerp: 3D Staaloverzicht Atrium (dakconstructie)			Fabrieksfasen: 32 en 44

Materiaal:	S235	T.A.V.	Bouten: 8.8-THVZ gerold	T.A.V.	
Lassen:	zie werkplaatstekeningen				
Algemeen:	S235	a = 0,38 x t	S355	a = 0,44 x t	

VIC OBDAM
BOUWEN BEGINT MET STAAL

Projectnummer - opdrachtphase:
270288-1008
Tekening:
G [118]

T: 0226-453 044 (algemeen)
T: 0226-363 690 (tekening)

Montage met de Torenkraan

Montage na verwijderen Torenkraan
