



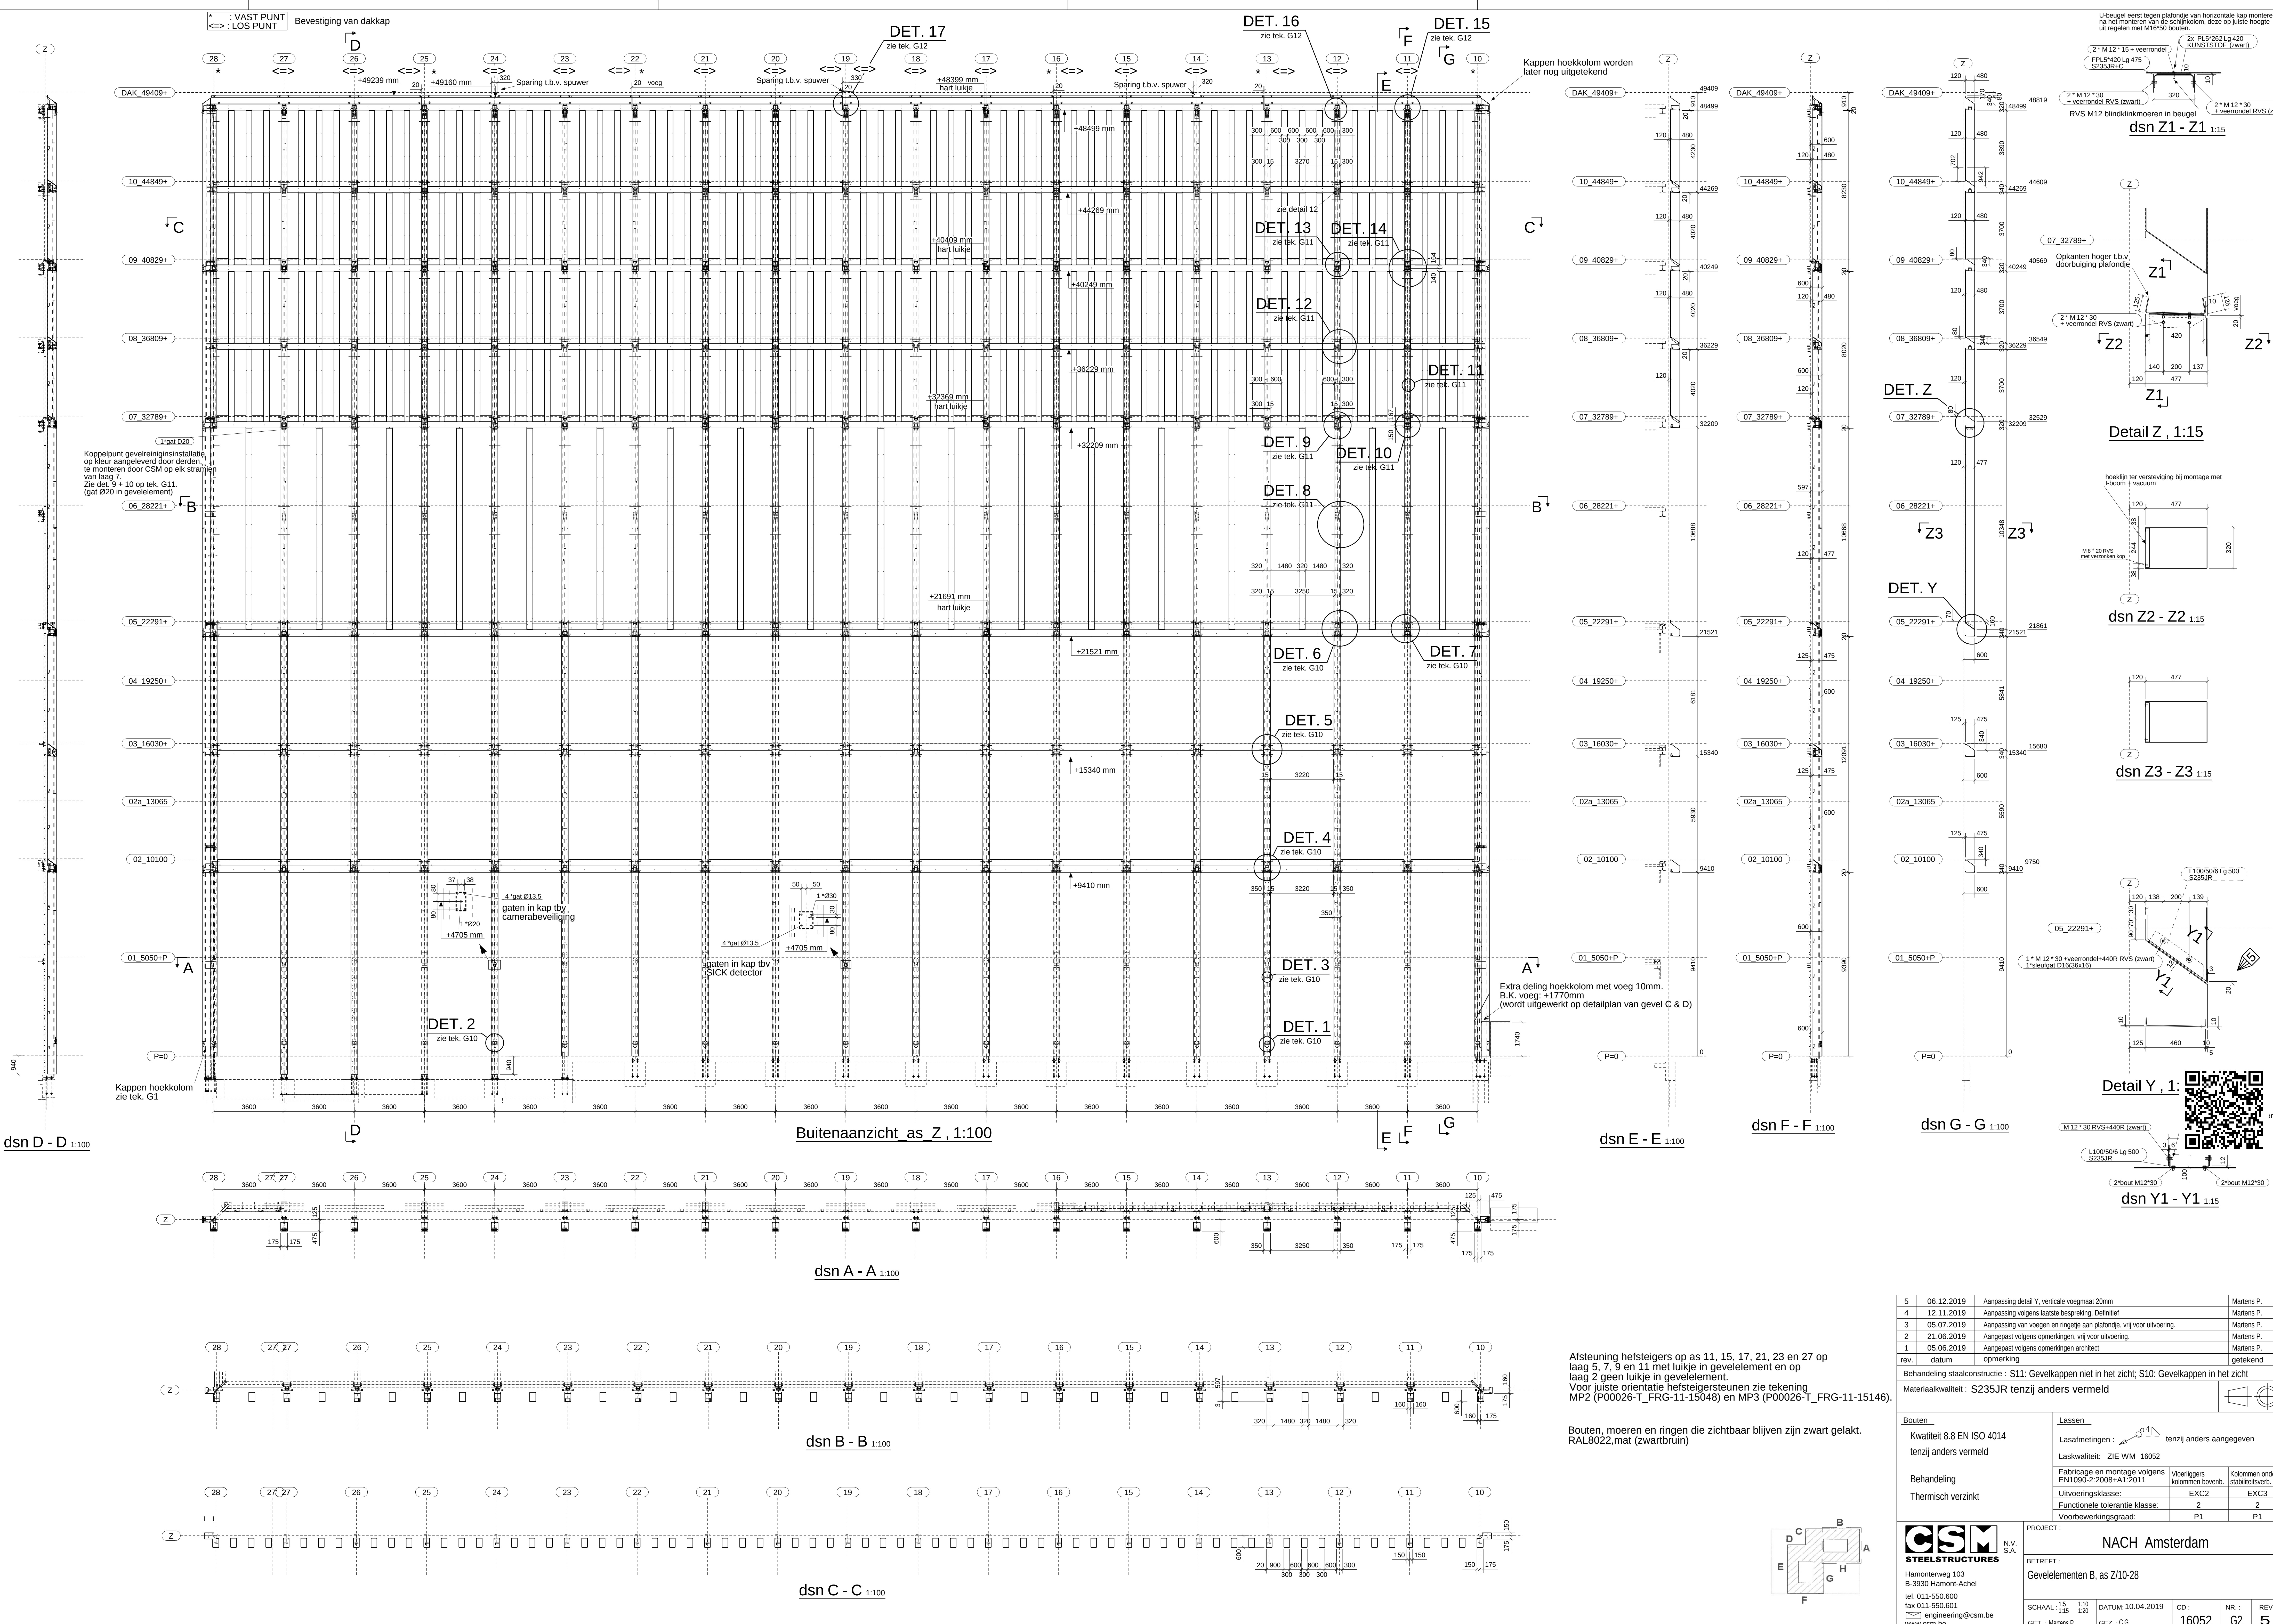

5	06.12.2019	Aanpassing detail Y, verticale voegmaat 20mm	Martens P.
4	12.11.2019	Aanpassing volgens laatste bespreking, Definitief	Martens P.
3	05.07.2019	Aanpassing van voegen en ringetje aan plafonde, vrij voor uitvoering.	Martens P.
2	21.06.2019	Aangepast volgens opmerkingen, vrij voor uitvoering.	Martens P.
1	05.06.2019	Aangepast volgens opmerkingen architect	Martens P.
rev.	datum	opmerking	getekend

Behandeling staalconstructie : S11: Gevelkappen niet in het zicht; S10: Gevelkappen in het zicht
Materiaalkwaliteit : S235JR tenzij anders vermeld

Bouten	Lassen
Kwaliteit 8.8 EN ISO 4014 tenzij anders vermeld	Lasafmetingen :  tenzij anders aangegeven Laskwaliteit: ZIE WM 16052
Behandeling	Fabricage en montage volgens EN1090-2:2008+A1:2011
Thermisch verzinkt	Uitvoeringsklasse: EXC2 Functionele tolerantie klasse: 2 Voorbewerkingsgraad: P1
	Vloerliggers Kolonnen onderb. stabiliteitsverb.
	EXC3 2 P1



N.V.
S.A.
Hamonteweg 103
B-3930 Hamont-Achel
tel. 011-550.600
fax 011-550.601
engineering@csm.be
www.csm.be

PROJECT : NACH Amsterdam

BETREFT : Gevelementen B, as Z10-28

SCHAAL : 1:15
GEZ. : C.G.

DATUM : 10.04.2019
CD : 16052

NR. : G2

REV. : 5

Afsteuning hefsteigers op as 11, 15, 17, 21, 23 en 27 op laag 5, 7, 9 en 11 met luikje in gevelement en op laag 2 geen luikje in gevelement.
Voor juiste oriëntatie hefsteigerstukken zie tekening MP2 (P00026-T_FRG-11-15048) en MP3 (P00026-T_FRG-11-15146).

Bouten, moeren en ringen die zichtbaar blijven zijn zwart gelakt.
RAL8022.mat (zwartbruin)
