Posnr	Diameter	Aantal	Buigvorm
1357	8	5	631
1361	12	4	631
1678	10	4	631
1701	10	43	26 / 40
1703	8	16	17 / 40
1725	10	33	91° / 50 / 22 / 50
1728	8	64	40 / 82° / 22 / 40
1729	8	43	17 / 9 / 22 / 27 / 89
1738	10	3	40 / 114
1739	10	1	40 / 165
1741	10	12	75 / 28 / 75
1742	8	43	80
1916	10	12	78

KOLON prefab beton

Nijverheidslaan 4A
8560 Gullegem

T: +32 56 28 29 19
F: +32 56 28 20 01
E: info@kolon.be

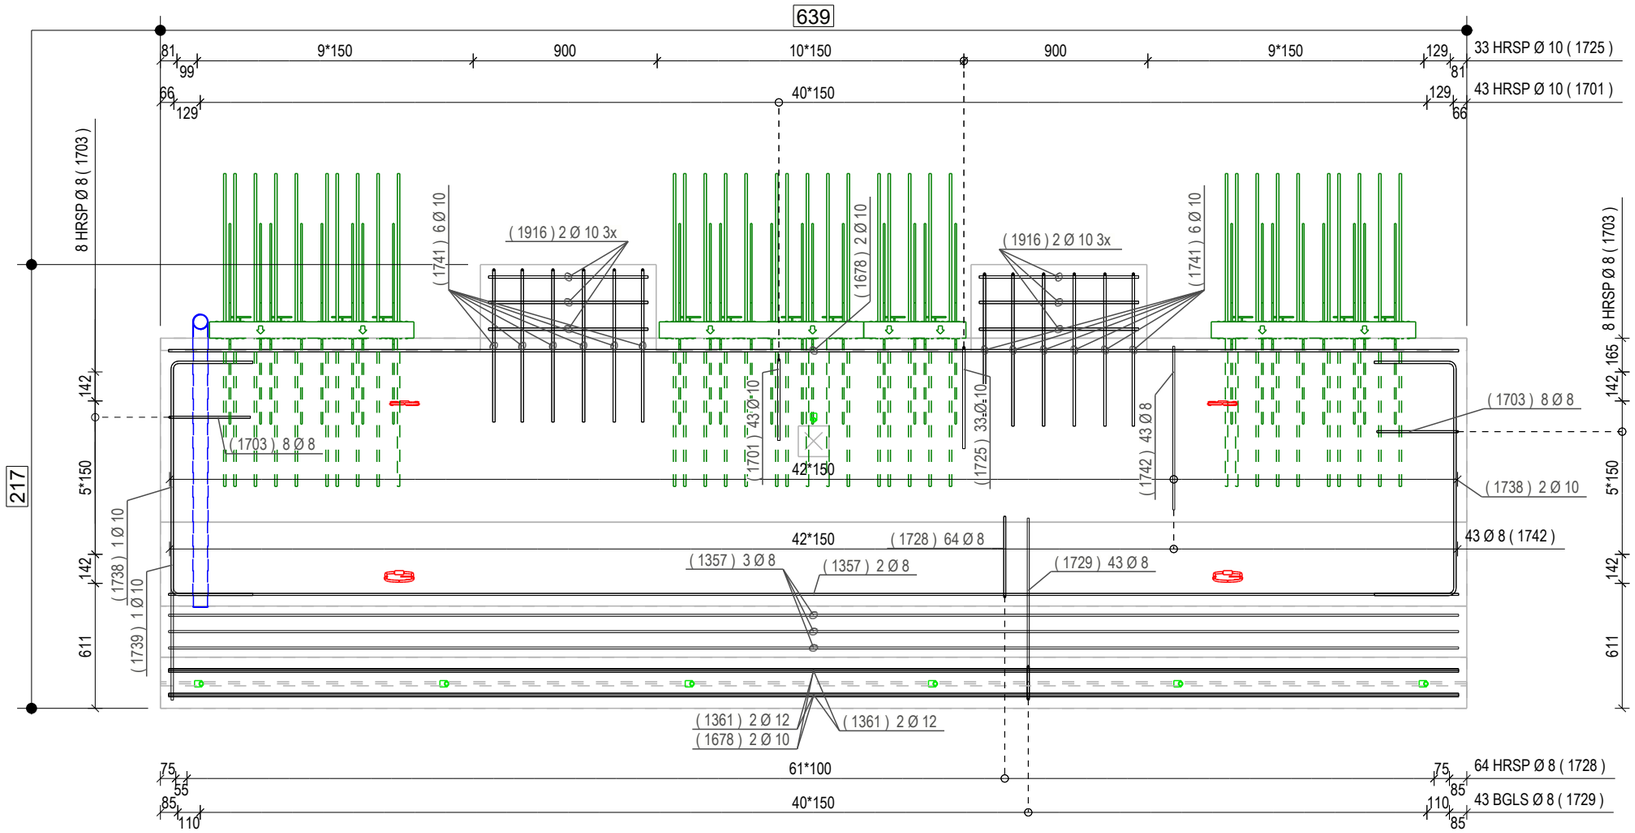

STORTZIJDE / COTE TALOCHEE

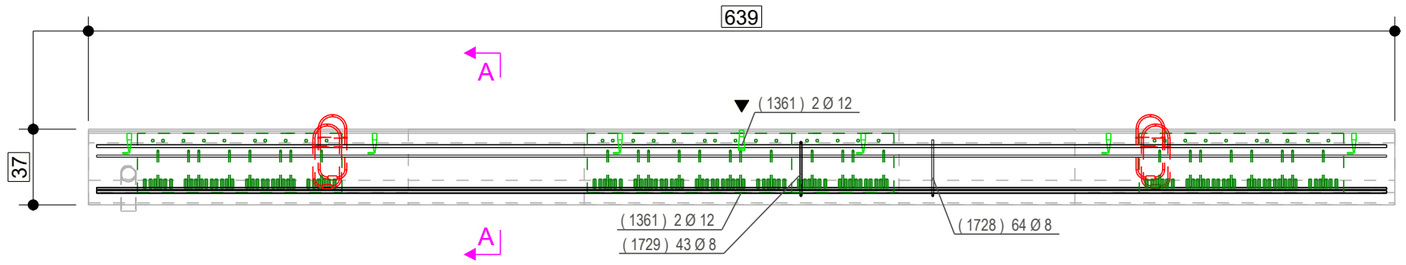

ZIJAANZICHT / VUE DE COTE

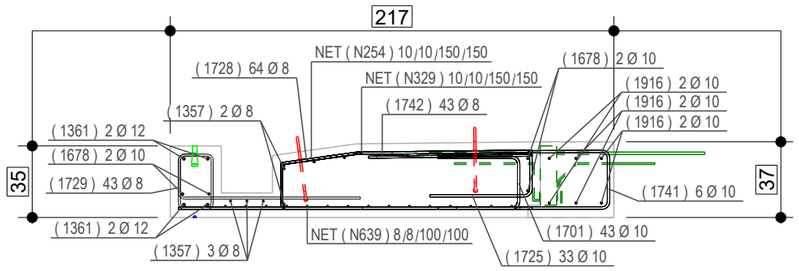

A - A

Element nummers	Maatvoering	Inbouw en wap.	Stortdatum	Eindcontrole
Ter 7.12.4				

BLAUWPOORTE Fase 3 | B7

Status: VOOR UITVOERING

Werf/Chantier: 023.17UV

Fase/Phase: Terras 11E

Betonkwaliteit / Qualité du béton: C30/37 EE3

AANTAL / NOMBRE: **1**

	17.12.2024	Goedgekeurd/Approuvé	
E			
D			
C			
B			
A			
-	28.11.2024	Eerste opmaak/Première édition	KD

Dekking/enrobage:	40	mm
Lengte/longuer:	6390	mm
Hoogte/taille:	370	mm
Dikte/épaisseur:	2170	mm
Volume:	3.931	m³
Gewicht/poids:	9794	kg
Wap./Renforc. (kg):	359.61	kg

KREANTIS connect the dots

Kreantis/Producent is niet verantwoordelijk voor de studie van de elementen. Alle afmetingen en wapening op dit plan dienen door de aannemer gecontroleerd te worden. De aannemer is ervoor verantwoordelijk de plannen ter goedkeuring voor te leggen aan het betrokken studiebureau. productie wordt slechts aangevat na ontvangst van een goedgekeurd plan.
Kreantis/Producteur n'est pas responsable pour l'étude des éléments. toutes les messures et le ferrailage dans ce plan doivent être controlées par l'entrepreneur. L'entrepreneur a la responsabilité de soumettre les plans pour approbation au bureau d'études. La production ne commencera qu'après réception, par nous, du plan approuvé.

Tekla Structures
